



## Restauratie Kerktoren Sint-Cornelius

*De restauratiewerken zijn volop in uitvoering.*

*”Pasen: jezelf overstijgen, ook als de klokken zwijgen”*

Het spandoek met deze boodschap dat aangebracht werd op de bovenste etage van de steigers spreekt boekdelen. Ook over de torenwerken. Het is immers niet omdat uurwerken stilstaan en klokken zwijgen, dat herstellingswerken aan de kerktoren niet zouden doorgaan. Integendeel! Deze weken wordt duchtig verder gewerkt.

In totaliteit zijn een 150-tal schadegevallen geteld. Een zeer uitgebreide beschrijving is opgemaakt van de manier waarop elk schadegeval zal hersteld worden. Een aantal natuurstenen wordt volledig vervangen door nieuwe stenen. Van andere stenen zal een stuk uitgeslepen worden dat nadien wordt opgevuld met een nieuw gekapt stuk ('inboetstuk' of 'bouchon'). Lichte beschadigingen kunnen gerepareerd worden met een laagje restauratiemortel (weliswaar verstevigd met kleine ankertjes). En bepaalde kleine oneffenheden worden helemaal niet weggewerkt omdat deze gewoon eigen zijn aan het natuurlijk uitzicht van een 'natuursteen'. Er werd tevens bepaald welke muurdelen zullen hervoeegd worden en hoe de monelen zullen hersteld worden (door versterking met T-profielen).

De problemen met de natuurstenen rondom (en in) de galmgaten zijn aanzienlijk omvangrijker dan oorspronkelijk gedacht.



Deze weken is de aannemer bezig met de monelen verder vrij te maken en de dwarsstangen (waarop de galmborden bevestigd worden) los te zetten. Hierdoor wordt de stabiliteit van de middenmonelen op proef gesteld. Eén van de middenmonelen

heeft het begeven (gelukkig zonder schade). De zwakkere middenmonelen werden ondertussen versterkt om ongevallen door instabiliteit te voorkomen.




Daarnaast wordt verder gewerkt aan het doorvoeren van verankeringen van gescheurd metselwerk (zoals boven de uurwerken), de voegwerken en de voorbereidingen voor de steenherstellingen.

De levering van de nieuw gekapte stenen kan maar gebeuren vanaf juli. Daarna zijn nog verschillende weken nodig voor de montage van de stukken. Het bouwverlof vindt plaats vanaf 20 juli tot 11 augustus. Dit betekent dat het einde van de werken voorzien wordt rond eind augustus.



Midden mei wordt finaal beslist welke kleuren voor de voeg- en restauratiemortel het meest aangewezen zijn.

De aanwezigheid van een stelling rondom de toren vormt de ideale gelegenheid om ook enkele andere onderhoudswerken uit te voeren. Daarom werd beslist dat bij het einde van de restauratiewerken ook de kroonlijst onderaan het dak rondom de toren zal herschilderd worden en dat de spotverlichting van de toren terug op punt gezet zal worden.

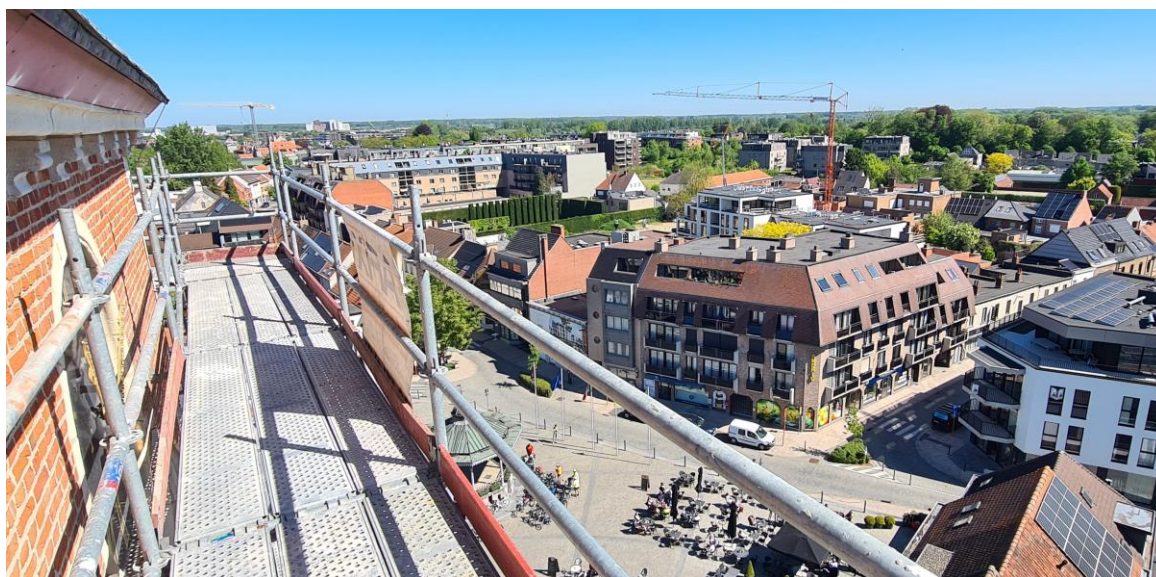

*Namens de Kerkraad Sint-Cornelius*

*Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Herman Arnouts, penningmeester Kerkraad via [herman\\_arnouts@hotmail.com](mailto:herman_arnouts@hotmail.com).*
