

Restauratie Kerktoeren Sint-Cornelius

De restauratiewerken aan de kerktoeren zijn, duidelijk zichtbaar voor iedereen, van start gegaan op maandag 19 januari 2026.



Tijdens de eerste weken werd gestart met een zeer intensief werk: het bouwen van een steiger rondom de toren. De stelling bestaat uit dertien verdiepingen, die reiken tot aan de dakgoot (een hoogte van meer dan 27 meter). Ze werd op verschillende plaatsen verankerd in de gevels. Met een aparte trappentoren kunnen de dertien steiger-verdiepingen bereikt worden.



Beschermende doeken werden aangebracht om de omgeving te vrijwaren van stof en vuiligheid.

Vervolgens werden een paar werfcontainers geplaatst voor stockage van bouwmaterialen en als schaftruimte voor de werknemers.





Nadat de bouwwerf in orde gebracht was, werd begonnen met de reiniging van de buitengevels. De vier buitenmuren werden onder hoge druk grondig gereinigd. Het bakstenen metselwerk en de natuurstenen komen zo VEEL mooier tevoorschijn: vrij van verontreiniging, vergrauwing, algen en korstmossen.



Op die wijze wordt het mogelijk dat specialisten een gedetailleerde visuele inspectie kunnen uitvoeren van de natuurstenen elementen (die deels moeten vervangen en/of hersteld worden). Deze inspectie staat gepland in februari.

De volgende weken gebeurt het meeste werk binnenin de toren. Daarbij maakt de aannemer de galmgaten aan de binnenzijde vrij (de vogelnetten gaan tijdelijk weg). Verder schermen ze het volledige klokkensysteem af tegen stof en vuil. Daarna is het de bedoeling om boven de klokken (op de 'klokkenstoel') een platform te creëren vanwaar aan de binnenzijde van de galmgaten kan worden gewerkt.

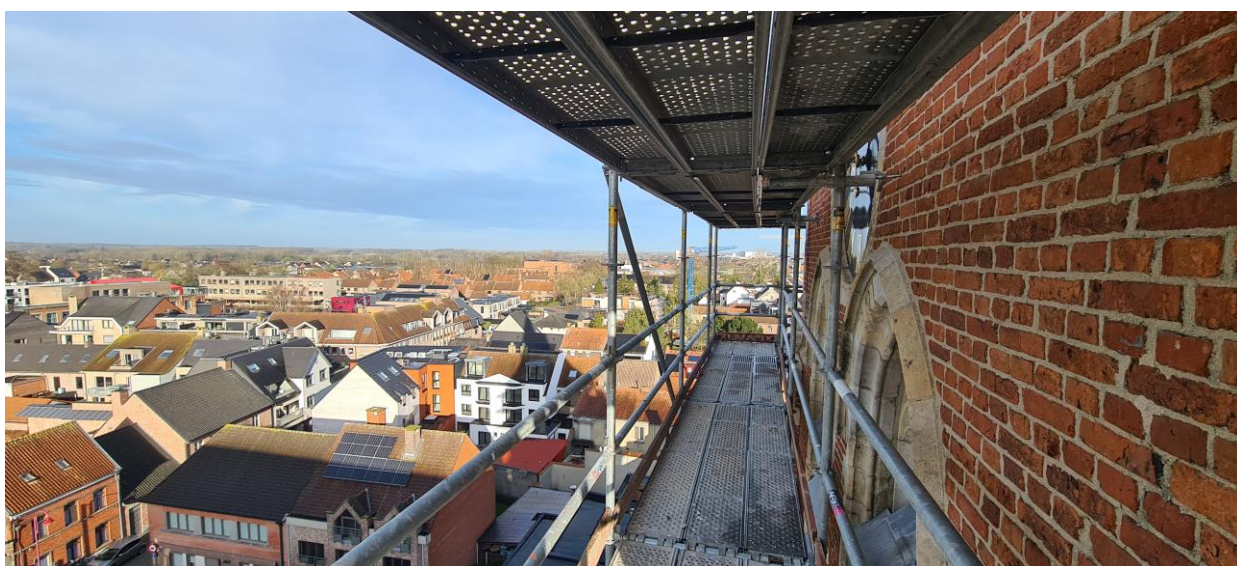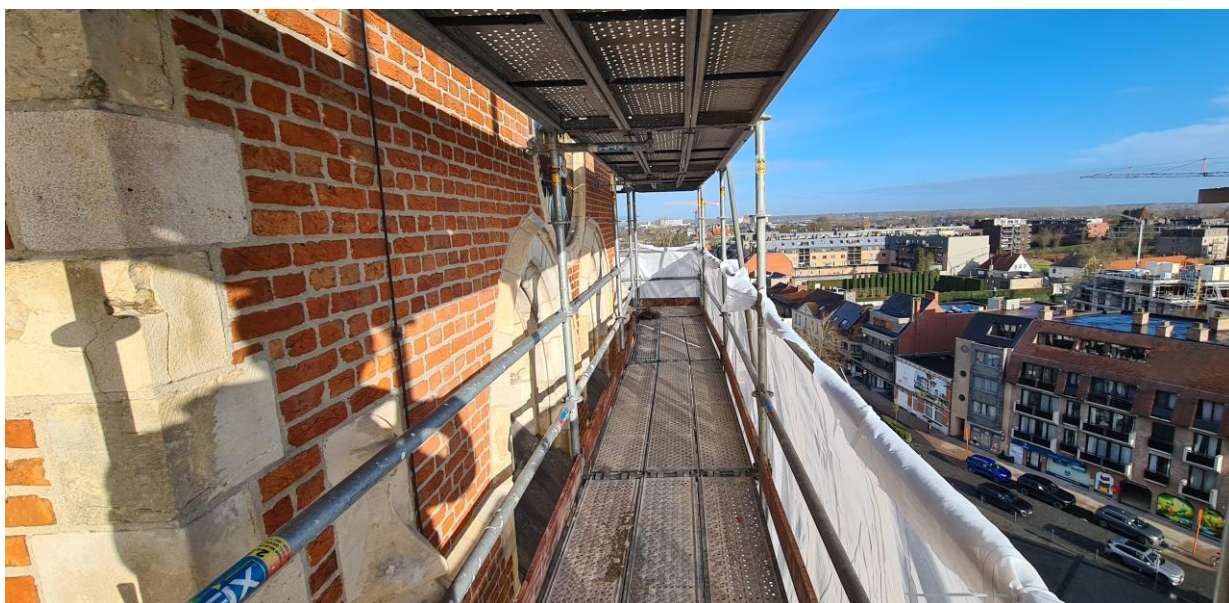

*Namens de Kerkraad Sint-Cornelius
Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Herman Arnouts, penningmeester
Kerkraad via herman_arnouts@hotmail.com.*
